


SwedPop

Svenska befolkningsdatabaser för forskning

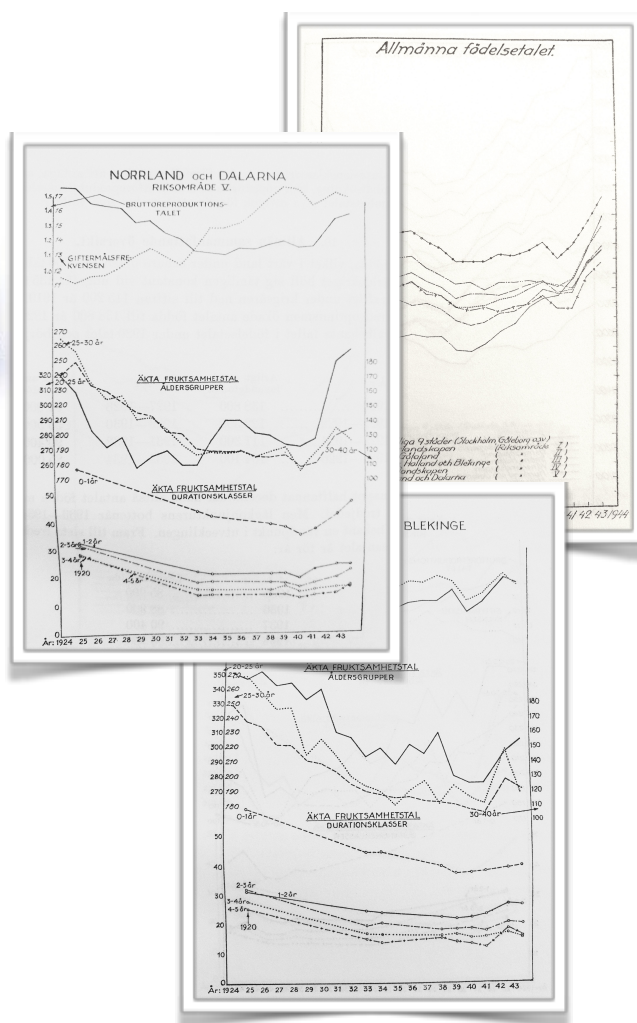

RIKSARKIVET STOCKHOLMS STADSARKIV

UMEÅ
UNIVERSITETGÖTEBORGS
UNIVERSITETLUNDS
UNIVERSITET

SwedPop finansieras av Vetenskapsrådet 2018-2022 och stöds av ett konsortium bestående av följande parter:

- **Umeå universitet: Demografiska Databasen (DDB)** Enheten för demografi och åldrandeforskning CEDAR. Livsförloppsdata för personer från ca 100 församlingar i olika svenska regioner 1650-1960. Folkräkningen 1950. Koordinator för projektet.
- **Göteborgs universitet: Göteborgs Befolkningspanel (GOPP)** Institutionen för ekonomi och samhälle. Fyraårspaneler för ett slumpvis urval bosatta i Göteborg under något av panelåren 1915-1943.
- **Lunds universitet: Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD)** Centrum för ekonomisk demografi. Livsförloppsdata för personer från ett antal skånska församlingar 1680-1968.
- **Riksarkivet: SweCens-databasen.** Folkräkningarna 1880-1940. Tvärsnitt vart tionde år för hela riket.
- **Stockholms stadsarkiv: Rotemansarkivet.** Livsförloppsdata för Stockholms befolkning 1877-1926.

1. Inledning

SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning 2018-2022

Bakgrund

Under 2017 beviljades den nationella infrastrukturen SwedPop bidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen *Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse: Infrastrukturer för forskning på individdatabaser inom samhällsvetenskap och medicin*. Projektets syfte är att utveckla och samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs, som väsentligt kommer att öka, förbättra och förenkla forskares tillgång till högkvalitativa svenska befolkningsdata för forskning. Databaserna kommer att samordnas och tillgängliggöras i en ny infrastruktur, SwedPop som bland annat kan användas för jämförande studier av hur människors liv, hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling över mer än 200 år. Genom länkning till andra forskningsregister möjliggörs därtill studier av flera aktuella medicinska forskningsfrågor.

Kärnan i SwedPop utgörs av fem stora forskningsdatabaser: Databaserna POPUM och POPLINK vid Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet, Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD) vid Centrum för ekonomisk demografi i Lund, Rotemansdatabasen vid Stockholms stadsarkiv, SweCens-databasen vid Riksarkivet och Gothenburg Population Panel (GOPP) vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet. DDB, SEDD och Rotemansdatabasen innehåller longitudinella individdata baserade på den svenska kyrkobokföringen i utvalda regioner. SweCens-databasen baseras på de svenska historiska folkräkningarna med information om hela den svenska befolkningen och GOPP är en panelstudie baserad på folkbokföringsdata från Göteborg under 1900-talet. Tillsammans erbjuder de fem databaserna sammanhängande information om den svenska befolkningen från tidigt 1800-tal och fram till 1950, med regionala nedslag i skilda delar av Sverige. Data omfattar såväl stad som landsbygd och olika socioekonomiska miljöer, vilket ökar möjligheterna att göra jämförande studier, till exempel av samhälls- och befolkningsutveckling i olika svenska regioner, i städer och på landsbygden. Förhoppningen är att även andra databaser i förlängningen kommer att kunna knytas till SwedPop för att öka infrastrukturens vetenskapliga värde och täckningsgrad. En av dessa är Sveriges Dödbok med information om avlidna svenskar, insamlad av Sveriges Släktforskarförbund, som kommer att inkluderas i SwedPop mot slutet av bidragsperioden 2018-2022. Databasen kommer att förvaltas av Riksarkivet, genom avtal med Sveriges Släktforskarförbund. Folkräkningen 1950 har även förvärvats för projektets räkning och förvaltas av CEDAR/DDB

Övergripande målsättningar för projektet

Några av databaserna i SwedPop är redan väletablerade i forskningsvärlden, medan andra inte har använts lika mycket för forskning. För att öka forskningspotentialen, för samtliga databaser och för infrastrukturen som helhet, kommer utvecklingen av SwedPop under bidragsperioden att fokusera på följande övergripande områden:

- Samordning av avkodning av yrken, dödsorsaker och geografiska enheter i den ingående databaserna

- Strukturering av data enligt en gemensam databasstruktur med enhetlig nomenklatur och kodningssystem
- Tillgängliggörande av data för forskare från en gemensam portal, swedpop.se
- Länkning av individer mellan de olika databaserna
- Insamling av kompletterande data för att fylla luckor i tid och rum samt för att öka jämförbarheten mellan databaserna
- Etablering av SwedPop som nationellt centrum för äldre befolkningsdata (före SCB-registren) på mikronivå

Särskilda villkor för bidraget (2017-00666) samt budget och övergripande arbetsplan fastställdes av Vetenskapsrådet 2017-12-21.

Utgångspunkter

Verksamhetsplanen för SwedPop tar sin utgångspunkt i de särskilda bidragsvillkor och den budget och arbetsplan som har fastställts av Vetenskapsrådet (2017-00666) för bidragsperioden 2018-2022.

Verksamhetsplan för varje år utarbetas av ledningsgruppen för SwedPop. Planen fastställs därefter av styrgruppen för projektet och ska under bidragsperioden vara Vetenskapsrådet tillhanda senast den 15 november.

Verksamhetsplanen är strukturerad utifrån de moduler som finns angivna i budget och arbetsplan för projektet. Planen fastställdes 2020-xx-xx av styrgruppen för SwedPop.

Delresultat

Projektet är organiserat i moduler, där arbetet inom varje modul mynnar ut i ett antal mätbara delresultat (färdigställda verktyg, datainsamlingar, tillgängliggörande av data osv.). Planerade delresultat under bidragsperioden finns beskrivna i den strategiska planen för SwedPop fastställd av styrgruppen 2018-06-04. Under 2021 är målsättningen att arbetet ska leda fram till följande delresultat:

A	GOPP-databasen har kompletterats med uppgifter om inkomst och yrke för personer observerade 1943 (kommer att skjuta över på 2022)	5
B	Yrken och församlingsinformation i Rotemansdatabasen har kodats.	6
C	SEDD-databasen har kompletterats med inkomstdata för åren 1905, 1933, 1938 and 1944.**	9
D	POPLINK-databasen har kompletterats med befolkningsdata från Nysätra församling.	11
E	SEDD-databasen har kompletterats med befolkningsdata från Landskrona 1904-1910.	10
*	Under 2021 ska ett uttagsverktyg med full funktionalitet finnas tillgängligt på SwedPop.se, där forskare kan hämta hem harmoniserade data från samtliga databaser Kvarstår från 2020 (Delmål 2020:a)	3
*	Utveckling av verktyg för att länka samman databaserna i SwedPop slutförs Kvarstår från 2019 (Delmål 2019:g)	4
*	Fortsatt registrering och länkning av tidigare ej registrerade dödsorsaksintyg i Rotemansdatabasen * Kvarstår från 2020 (Delmål 2020:c)	7

* Se vidare text under respektive modul.

**Av arbetskonomiska skäl har ordningen för inregistreringen av längderna förändrats, vilket påverkar målformuleringen. Se vidare text under modul 9.

2. Moduler - aktiviteter och tidsplan

Modul 1

Organisation och ledning

Modul 1 har en stödjande roll i projektet. Här finns budget för projektledning, administration, resor och projektmöten. Inga specifika verksamhetsmål har utarbetats för 2021.

Modul 2

A. Harmonisering av kodning:

1. Harmonisering av variabler

- Dödsorsaker
- Yrke
- Församlingskodning

1a: Dödsorsaker

Nuläge

Det grundläggande arbetet med harmonisering av dödsorsakskodning i SwedPop är avslutat och rutiner för löpande kodning av nya dödsorsaker har tagits fram.

Kodningen av dödsorsaker påbörjades under samordningsprojektet 2016-2017 och har fortsatt under 2018 och 2019. Dödsorsaker i Umeå och Lund är kodade enligt gemensamma principer medan kodningen av dödsorsaker i Rotemansdatabasen ännu inte är avslutad (se modul 7). SweCens- och GOPP-databaserna innehåller inga dödsorsaker.

Aktiviteter under 2021

1. Ta fram en användaranpassad dokumentation som tillgängliggörs på swedpop.se
2. Utse en referensgrupp för kodning av nya dödsorsaker

Tidsplan

Övergår till löpande verksamhet

1b. Yrken*Nuläge*

Det grundläggande arbetet med harmonisering av yrkeskodning har slutförts. Ett gemensamt kodschema för yrkeskodning, *Yrkeskodning i SwedPop 2.0*, har tagits fram och fastställts av ledningsgruppen 2020-06-12. Rutiner för fastställande av nya yrkeskoder, när behov av sådana uppstår under det löpande arbetet, har tagits fram. En dokumentation av de principer som används för yrkeskodning inom SwedPop, kommer under hösten 2020 att tillgängliggöras på swedpop.se. Arbeta med standardisering av yrkessträngar pågår i Umeå. Avsikten är att all yrkeskodning inom SwedPop i framtiden ska kunna utföras maskinellt.

Aktiviteter under 2021

1. Implementering av fastställt kodschema för kodning av yrkesuppgifter genomförs av varje databas för sig.
2. Slutföra standardisering och HISCO-kodning av yrkessträngar.

Tidsplan

Övergår till löpande verksamhet så snart standardisering är slutförd.

1c. Församlingskodning*Nuläge*

Arbetet med harmonisering av församlingskodning har fortsatt under 2020 under ledning av en särskild arbetsgrupp. En gemensamt kodschema har fastställts, som tar hänsyn till förändringar över tid, samt en översättningstabell från befintlig kodning. Implementering och omkodning utförs av varje databas för sig. Harmoniseringen av församlingskodning är därmed slutförd.

Aktiviteter under 2021

1. Ta fram en användarpassad dokumentation som tillgängliggörs på swedpop.se
2. Undersöka hur mycket tid och resurser som skulle krävas för att utöka kodschemat med ytterligare geografiska enheter, till exempel pastorat.

Tidsplan

1. Fortsatt harmonisering av församlingskodning sker vid behov, när nya, tidigare okodade geografiska områden läggs till, enligt de principer som fastställs.

B. IDS-konvertering av databaserna:

Nuläge

Arbetet med IDS-konvertering av databaser i SwedPop, som startade redan under samordningsprojektet har fortsatt under 2018-2020. Arbetet har bestått av en omfattande probleminventering och analys med syfte att hitta gemensamma definitioner och principer för konverteringen till IDS 4.0. Under 2020 har arbetsgruppen fastställt metadata för ett gemensamt databasformat, som kommer att fastställas av ledningsgruppen under 2020. Innan beslut om fastställande görs en sista kontroll, genom att samtliga parter levererar in harmoniserade data i gemensamt IDS-format till Umeå. För att underlätta arbetet har ett skript som kontrollerar att data överensstämmer med fastställda metadata tagits fram. Varje part ansvarar också för att ta fram systemdokumentation för konverteringen. Arbetet är något försenat i förhållande till tidigare upprättad tidsplan då det har behövt samordnas med det pågående arbetet i modul 3, se nedan.

Aktiviteter under 2021

1. Utvidga befintliga IDS-versioner av databaserna. Vilka kompletteringar som behöver göras varierar mellan databaserna. Varje part ansvarar för att upprätta en tidplan för arbetet med sin databas. Arbetsplanen upprättas i dialog med arbetsgruppen för IDS
2. Ta fram en användaranpassad version av metadata för IDS 4.0 som ska tillgängliggöras på swedpop.se

Tidsplan

- Avsikten är att IDS-arbetet ska vara avslutat under 2021

Modul 3

A. Utveckling av ett enkelt uttagsverktyg på webportalen

Nuläge

Arbetet startade 2018 och fortsatte under 2019 med framtagande av en detaljerad kravspecifikation för uttagsverktyget. Systemutvecklingen har ägt rum vid DDB och SEDD och Riksarkivet har deltagit i planeringen av det pågående arbetet. Utvecklingen av uttagsverktyget har tagit mer tid i anspråk än beräknat, då det tidigt visade sig att den underliggande databasstrukturen behövde kompletteras för att nå önskvärd funktionalitet. En reviderad projektplan fastställdes av ledningsgruppen 2019-10-29 och arbetet med utveckling av verktyget startade. Under 2020 har en testversion tagits fram. Den kommer att vidareutvecklas under hösten och användartester kommer att göras. Frågor om juridik, etik och integritetsskydd i samband med tillgängliggörande diskuterades vid en workshop under september 2020. Avsikten är att uttagsverktyget ska lanseras under våren 2021. Förseningen under innevarande år beror i huvudsak på att arbetet har behövt samordnas med modul 2B IDS-konvertering av databaserna och att arbetsgrupperna under olika faser

av arbetet har behövt vänta in varandra. Ytterligare en anledning är att noggranna användartester behöver genomföras och utvärderas innan lanseringen på swedpop.se

Aktiviteter under 2021

1. Under 2021 ska ett uttagsverktyg med full funktionalitet finnas tillgängligt på SwedPop.se, där forskare kan hämta hem harmoniserade data från samtliga databaser (Delmål 2020:a kvarstår från 2020)

Tidsplan:

- Arbetet ska vara slutfört under våren 2021

B. Utveckling av webbportal

Nuläge

Under 2019 har swedpop.se har uppdaterats med aktuell information. I övrigt har arbetet med att utveckla webbsidan inte prioriterats, i väntan på uttagsverktyget. Under 2020 har arbetet återupptagits och en aktuell och uppdaterad webbsida ska finnas tillgänglig vid 2020 års slut, med dokumentation om databaser och data. En nyhetssida kommer också att utvecklas, som kan användas för marknadsföring av den nya infrastrukturen.

Aktiviteter under 2021

1. Utveckling av nyhetssidan på swedpop.se.
2. Användaranpassad dokumentation från harmoniseringsarbetet läggs upp på webben

Tidsplan:

- En uppdaterad och fungerande version av swedpop.se med all dokumentation ska finnas vid tillgängliggörandet av uttagsverktyget våren 2021

Modul 4

Utveckling av verktyg och metoder för att länka samman databaserna i SwedPop

Nuläge

Arbetet startade hösten 2018 med att ta fram en kravspecifikation för utvecklingen av ett länkningsverktyg och en plan för det fortsatta arbetet. Under 2019 påbörjades utvecklingen av verktyg för länkning av folkräkningar till Sveriges Dödbok. Därefter ska verktyg och metoder utvecklas fram för att länka övriga databaser till Sveriges Dödbok, för att slutligen länka alla databaser till varandra. Det ursprungliga målet var att förberedelserna för länkningen skulle vara slutförda under 2019, men metodologiskt motiverade omprioriteringar under arbetets gång har gjort arbetet något försenat i förhållande till tidigare plan. En utvärdering har lagts in i processen vilket i korthet innebär att ett

analyssteg har lagts in efter det första länkningssteget (folkräkningar-Sveriges Dödbok), för att se om eventuella justeringar behöver göras.

Aktiviteter under 2021

1. Utveckling av verktyg och metoder för att länka samman databaserna i SwedPop slutförs (Delmål 2019:c, kvarstår från 2019)
2. Utarbeta dokumentation av utvecklade länkningsmetoder

Tidsplan:

Arbetet ska vara avslutat under 2021.

Modul 5

Utvidga GOPP-databasen med nya data

Nuläge

GOPP-databasen innehåller paneldata för ett 1-procentigt urval från Göteborgs befolkning 1915-1943. I denna modul kommer databasen att utvidgas, genom att de personer som kan observeras 1943 följs fram till 1967 och att nya urvalspersoner födda eller inflyttade efter 1943 tillförs och följs till 1967. I nuläget har alla urvalspersoner länkats till databaserna Sveriges dödbok och Sveriges befolkning 1990, och för 45 procent av tilläggspopulationen har uppgifter registrerats från personakterna. Excerpering av uppgifter ur församlingsböckerna pågår och i nuläget har 12 procent av tilläggspopulationen registrerats. Av praktiska skäl har inregistreringsordningen ändrats något, vilket påverkar målformuleringen. Kompletteringen av uppgifter om inkomst och yrke för personer observerade 1943 (delmål 2021:a) kommer att färdigställas först under 2022.

Aktiviteter under 2021

1. Registreringen av uppgifter från församlingsböckerna fortsätter.
2. Komplettering av databasen med information om inkomst och yrke för personer observerade 1943 inleds.

Tidsplan

Datainsamlingen kommer att pågå hela bidragsperioden 2018-2022 och kommer inte att hinna avslutas under den femårsperiod som har beviljats medel.

Modul 6

Komplettering och länkning av data i Rotemansdatabasen

Nuläge

När Rotemansdatabasen byggdes upp registrerades ca 40% av alla poster med en förenklad metod som innebar att viss information utelämnades. För att öka databasens forskningspotential behöver denna information kompletteras och länkas. Förstudie, validering och dokumentation utfördes under 2018 och kompletteringsarbetet startade 2019.

Aktiviteter under 2021

1. Fortsatt komplettering och länkning av tidigare utelämnade data i Rotemansdatabasen.
2. Yrken och geografisk information kodas (Delmål 2021:b)
3. Kontextinformation om familj och hushåll kodas enligt SwedPop-standard utifrån kompletteringsinformationen.

Tidsplan

Kodning av yrken och geografisk information kommer att vara genomförd under 2021. Övrig kodning görs i takt med fortsatt komplettering.

Modul 7

Komplettering av dödsorsaker i Rotemansdatabasen

Nuläge

För att Rotemansdatabasens information om dödsorsaker ska bli fullständig behöver en kompletterande inregistrering ske av uppgifter i Stadsläkarens arkiv. Under 2019 inskannades samtliga dödsorsaksintyg och länkning av tidigare olänkade poster påbörjades. En analys har också gjorts av var kompletteringar behöver ske. Under året har ytterligare 20 000 dödsbevis återfunnits, som behöver bearbetas. I nuläget har 200.000 av 240.000 dödsorsaksintyg transkriberats och 75% av dessa har länkats till databasen. Transkriberingen skulle ha varit slutförd vid halvårsskiftet 2020, men har försenats till följd av den pågående Corona-pandemin.

Aktiviteter under 2021

1. Fortsatt registrering och länkning av tidigare ej registrerade dödsorsaksintyg. (Delmål 2020:c)
2. Standardisering och kodning av dödsorsaker till SwedPop-format, i samarbete med DDB.

Tidsplan

Arbetet beräknas vara slutfört vid halvårsskiftet 2021.

Modul 8

Komplettera Rotemansdatabasen med ekonomiska data

Nuläge

För att öka den komparativa forskningspotentialen i SwedPop kommer Rotemansdatabasen att kompletteras med ekonomiska data. Arbetet kommer att inledas med validering och länkning av 1901 års huvudförteckning (den del av mantalsuppgifterna som listar samtliga lägenheter med information om innehavare, rumsantal, hyra, mm), som finns tillgänglig men i råformat och endast partiellt länkad. Arbetet startade under hösten 2019, men har inte prioriterats under 2020. Stadsarkivets resurser har varit knappa under Corona-pandemin och fokus har fortsatt lagts på arbetet i modul 6 och 7.

Aktiviteter under 2021

1. Fortsatt validering av registret för 1901 års huvudförteckning
2. Fortsatt verifiering av tidigare utförd länkning av 1901 års huvudförteckning

Tidsplan

Kompletteringsarbetet kommer att pågå fram till 2022

Modul 9

Komplettering av SEDD med ekonomiska data för Landskrona 1905-1947

Nuläge

Motsvarande ekonomiska data från inkomst- och taxeringsregister för tidsperioden 1948-1968 finns sedan tidigare inkluderade i databasen och används för forskning. Arbetet inom denna modul avser en komplettering med data för tidsperioden 1905-1947, för att öka databasens forskningsvärde. Hittills har inkomstlängderna för åren 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1938, 1940 och 1945-46 registrerats och länkats till databasen. Strategin i modulen har justerats något i förhållande till projektets långsiktiga strategiska plan: Istället för att registrera alla år i ordning, så registreras längderna först med tio års mellanrum, därefter mellanliggande år.

Aktiviteter under 2021

1. Inkomst- och taxeringsuppgifter för åren 1906, 1910, 1942 och 1944 kommer att registreras och länkas till SEDD (Delmål 2021:e)
2. Yrkesuppgifter från längderna kodas.
3. SEDD-databasen har kompletterats med inkomstdata för åren 1906, 1933, 1938 and 1944 (Delmål 2021:c)

Tidplan

Arbetet kommer att pågå under hela bidragsperioden 2018-2022.

Modul 10

Komplettering av SEDD med befolkningsdata för Landskrona 1895-1910

Nuläge

Befolkningsdata för Landskrona 1910-1968, och från omkringliggande församlingar 1813-1968 har inkluderats i SEDD inom ramen för tidigare projekt.

Aktiviteter under 2021

1. Data från församlingsböckerna för perioden 1904-1910 registreras och länkas till befintlig databas
2. SEDD-databasen har kompletterats med information om fars yrke för individer i Landskrona födda 1905-1947 (Delmål 2021:e)
3. Kontroll av registreringen mot födelse-, död-, giftermåls-, och flyttningslängder
4. Kodning av tillkomna yrken och dödsorsaker.
5. SEDD-databasen har kompletterats med befolkningsdata från Landskrona 1904-1910 (Delmål 2021:e)

Tidplan

Arbete kommer att pågå under tidsperioden 2020-2022.

Modul 11

Komplettering av DDB med befolkningsdata för Nysätra församling

Nuläge

Sedan 2008 har befolkningsdatabasen POPLINK varit under uppbyggnad vid DDB i Umeå, inom ramen för tidigare projekt. Avsikten är att databasen på sikt ska omfatta befolkningen i Västerbotten 1700-1950. Att inkludera befolkningsdata från Nysätra är av strategisk betydelse för att knyta samman databasens två stora befolkningskluster, Skellefteå och

Umeå. Avsikten vara att arbetet skulle vara slutfört vid utgången av 2020, alltså något före upprättad tidplan. Det har emellertid försenats något till följd av den pågående Corona-pandemin och därmed följande restriktioner, då de avslutande länkningsmomenten inte kan utföras på distans utan kräver närvaro på arbetsplatsen. Om inget förändras under hösten 2020 kommer länkningen att slutföras under våren 2021. Data inkluderas i POPLINK när en ny version av databasen tas fram senare under året.

Aktiviteter under 2021

1. Avslutande länkning av befolkningsdata från Nysätra församling
2. POPLINK-databasen har kompletterats med befolkningsdata från Nysätra församling. (Delmål 2021:d)

Tidplan

Arbetet avslutas under 2021

Modul 12

Komplettering av DDB med ekonomiska data för Lövångers församling

Nuläge

För att öka den komparativa forskningspotentialen i SwedPop kommer DDB:s befolkningsdatabaser att kompletteras med ekonomiska data. Arbetet har försenats då det tog tid att få fram det aktuella källmaterialet. De källor som innehöll den information som skulle digitaliseras var endast tillgängliga i original och kunde därmed inte lånas ut. Skanning av källmaterialet genomfördes under hösten 2019. En förstudie kunde starta under 2020 och utvecklingen av ett anpassat inregistreringsformulär började samma höst. Formuläret beräknas vara klart vid årsskiftet. Inför framtiden bevakas också arbetet i ett pågående projekt vid universitetet i Odense, med automatisk inläsning av ekonomiska data.

Aktiviteter under 2021

1. Inregistrering av inkomst- och taxeringslängder från Lövånger startar.

Tidplan

Datainsamlingen avslutas under 2022.

Modul 13

Inkludering av 1940 års folkräkning i SweCens-databasen

Nuläge

Idag finns folkräkningar från 1880, 1890, 1900 och 1910 tillgängliga för forskning i SweCens-databasen. Arbetet med 1930 års folkräkning, finansierat av andra projekt, är snart färdigt. Under 2018 utvecklades ett nytt formulär i inregistreringssystemet PERSONA avsett för folkräkningar som är driftssatt. Inscanningen av källmaterialet är genomförd och datainsamling har påbörjats. De första församlingarna är nu komplett inregistrerade. I samarbete med Sveriges Släktforskarförbund startade under hösten 2019 ett storskaligt citizen science-projekt där frivilliga släktforskare deltar i inregistreringsarbetet. Förhoppningen är att datainsamlingen därigenom ska kunna ske i snabbare takt än vad som tidigare planerats.

Aktiviteter under 2021

1. Fortsatt inregistrering av data i 1940 års folkräkning.
2. Rekrytering av ytterligare registrerare i Sveriges Släktforskarförbunds regi

Tidplan

Datainsamling påbörjas 2019 och kommer att pågå hela bidragsperioden, till och med 2022. Den kommer med nuvarande resurser inte att hinna avslutas under den tid projektet har finansiering.

Modul 14

Inkludering av 1950 års folkräkning i SwedPop

Nuläge

Folkräkningen från 1950 har transkriberats och digitaliserats för genealogiska ändamål av Arkiv Digital (AD). Enligt den ursprungliga projektplanen skulle dessa data genom ett samarbetsavtal mellan AD och Riksarkivet inkluderas i SweCens-databasen och tillgängliggöras för forskningsändamål. Innan projektstart sades samarbetsavtalet upp av AD och en ny överenskommelse med RA har inte kunnat nås. Under våren 2020 kunde slutligen dessa data upphandlas för projektets räkning och de kommer att förvaltas vid CEDAR/DDB i Umeå. Arbetet med upparbetning, kodning och verifiering startade under våren och avsikten är att det ska kunna slutföras under 2021.

Aktiviteter under 2021

Fortsatt upparbetning och kodning av 1950-års folkräkning samt anpassning till användning för forskningsändamål (Delmål 2019:g)

Tidplan

Arbetet ska vara avslutat under 2021.

Modul 15

Sveriges dödbok

Nuläge

Genom ett avtal med Sveriges Släktforskarförbund har SwedPop fått tillgång till en kopia av senaste versionen av Sveriges Dödbok, för forskningsändamål. Databasen kommer att förvaltas av Riksarkivet. Sveriges dödbok innehåller information om alla individer som har avlidit i Sverige från 1860 och fram till idag. Databasen kommer att harmoniseras upparbetas och länkas samman med övriga databaser i SwedPop. Den kommer också att konverteras till IDS-format. Komplettering och harmonisering pågår inom ramen för andra projekt. Upparbetning och validering har startat i mindre skala under 2018 och 2019.

Aktiviteter under 2021

1. Kodning av geografisk information
2. Länkning till folkräkningar och övriga databaser i SwedPop.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå under tidsperioden 2020-2022
